


マンホールトイレ整備の進捗状況について

1. マンホールトイレ整備内容について

令和6年度は、河北小、西郷小、上灘小、社小、小鴨小に整備
マンホールトイレシステムの整備概要は次の通り

- ・トイレ（多目的1、男性2、女性3）
- ・注水口
- ・貯留弁付マンホール
- ・貯水槽
- ・防災井戸（深さ10～20m）
- ・防災倉庫
- ・マンホールトイレ用備品（トイレ建屋、便座等）

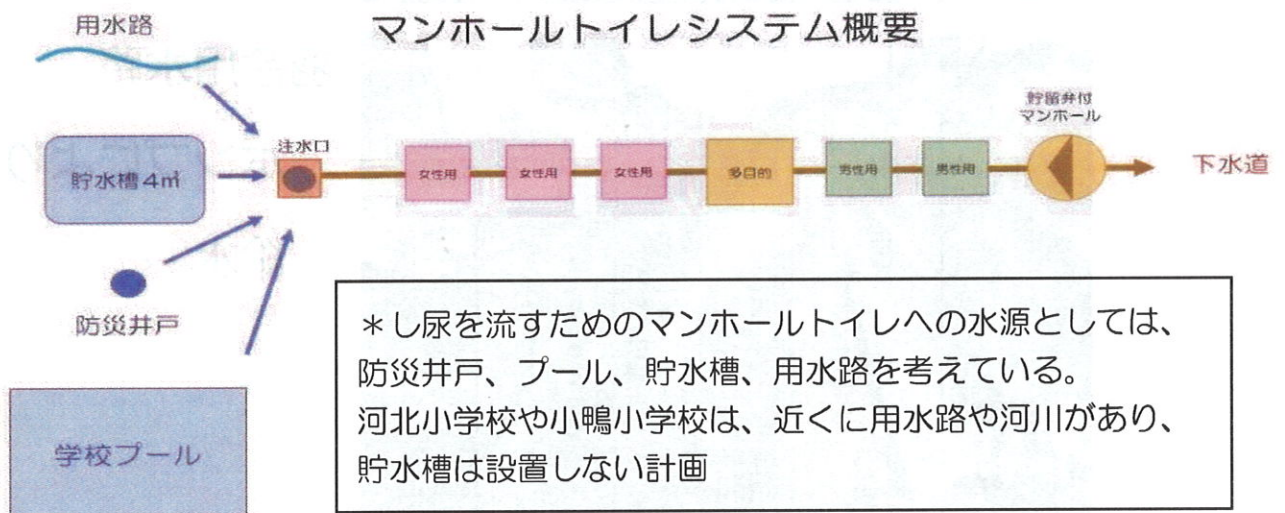

2. 現在の進捗状況と今後の予定について

防災井戸 河北小学校 掘削完了 84ℓ/毎分

その他も引き続きボーリングを行い、7月末までに完成予定

井戸ポンプや蛇口などの周辺設備を、引き続き整備し年度内完成予定

マンホールトイレシステム（トイレ用立上り管、注水口、貯留弁付マンホール、貯水槽）

6月に工事発注し10月に完成予定

小鴨小学校については、8月に工事発注し1月に完成予定

防災倉庫、その他の備品

米子市を視察（4月25日）し検討している。秋ごろを目途に発注予定

設計業務

5月14日に入札 業務期間：令和7年1月31日まで

令和7年度施工予定の上北条小、打吹小、明倫小、旧灘手小、旧北谷小、久米小、旧上小鴨小、関金小の8小学校の詳細設計

河北小学校



プール

消火栓口から
取り出し



羽合用水路

ポンプにより
給水



防災井戸

84ℓ / 毎分
(120m³ / 日)

小鴨小学校



プール

消火栓口から

取り出し



鴨川

ポンプにより

給水



用水路

ポンプにより

給水
